Sjælsø Plejecenter - 5ugers plan, ETAPE 2
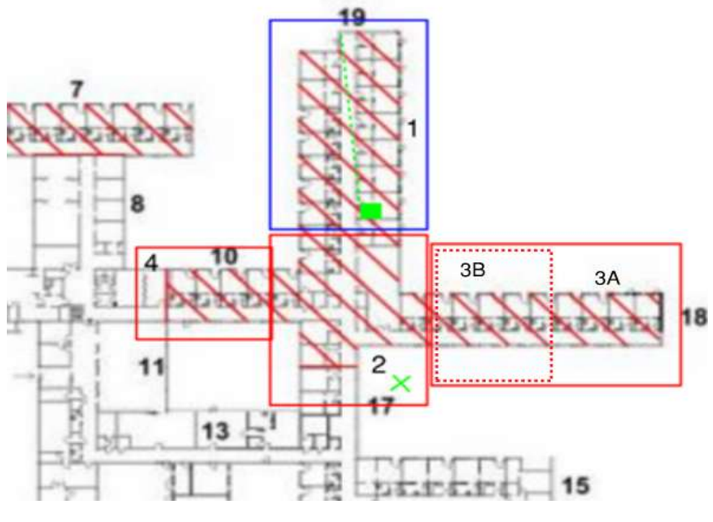
Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 33					Uge nr 34					Uge nr 35					Uge nr 36					Uge nr 37					Bemærkninger
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	
		Bygning 53																										
CG.Jensen	1	Armeringsarbejder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
CG.Jensen	2	Fundamentsstøbning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
CG.Jensen	3	Opfyld + terrændæksarbejder											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Bygning 51																										
CG.Jensen	4	Armeringsarbejder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
CG.Jensen	5	Fundamentsstøbning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
CG.Jensen	6	Opfyld + terrændæksarbejder											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Øvrige arbejder																										
Eriksson stillads	7	Opsætning stillads inkl. overdækning del 3A	x	x	x	x																						
J.Jensen	8	Opsætning lufttæt indertelt del 3A					x	x	x	x	x	x																
J.Jensen	9	Sanering tag del 3A											x	x	x	x	x											Opstart stilladsnedt. + tung nedrivning afventer afslutning af nedrivning af blok 1 for at kunne få affald ud.
Eriksson stillads	10	Opsætning stillads del 3B						x	x	x	x	x																
J.Jensen	11	Opsætning lufttæt indertelt del 3B											x	x	x	x	x											
J.Jensen	12	Sanering tag 3B																x	x	x	x	x						Opstart stilladsnedt. + tung nedrivning afventer afslutning af nedrivning af blok 1 for at kunne få affald ud.
BH/plejecenter	13	Nedtagning antenne + slukning strøm inden nedr.											x															
Eriksson stillads	14	Flytning stilladsoverdækning del 1												x	x	x	x	x	x									
Eriksson stillads	15	Nedtagning stillads efter flyt overdækning																		x	x	x	x	x	x			
J.Jensen	16	Tung nedrivning del 1																								x	x	
J.Jensen	17	Indvending sanering afsluttes	x	x	x	x	x																					
Lelectric	18	Føring Ascom+Rudersdal fiber				x	x	x	x	x	x	x																
Nexel	19	Etablering transformer-station											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
