Sjælsø Plejecenter - 5ugers plan, ETAPE 2 + bygn. 55
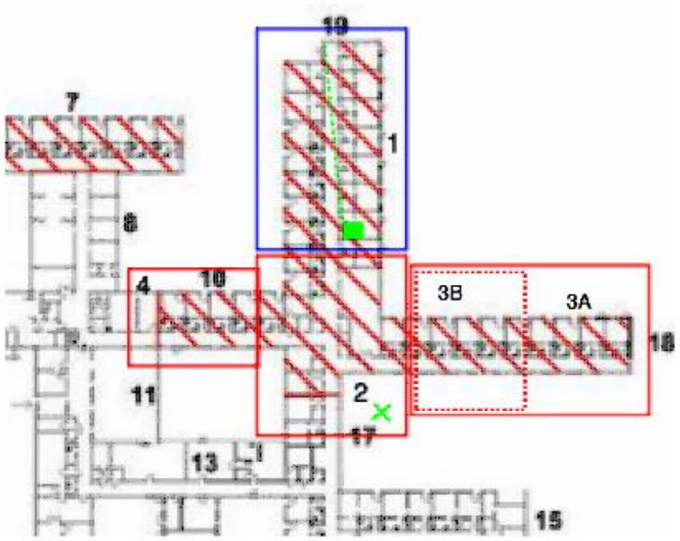
Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 49					Uge nr 50					Uge nr 51					Uge nr 52					Uge nr 1 (2026)					Bemærkninger
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	
		Bygning 53																										
CG.Jensen	1	Renselag, støbning	x	x																								
CG.Jensen	2	Jord og kloakarbejder		x	x																							
CG.Jensen	3	Fundaments arbejder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	
		Bygning 51																										
CG.Jensen	1	Pæleramning	x	x	x	x	x	x	x	x																		
CG.Jensen	2	Pæleklipning								x	x	x																
CG.Jensen	3	Jord og kloakarbejder											x	x	x	x	x											
CG.Jensen	4	Renselag, udgravning inden støbning																							x	x	x	
		Øvrige arbejder																										
A&K VVS	1	Indvendig rørføring - eksist. Plejecenter	x	x	x	x	x																					Opsætning loftsplader forventes i indeværende uge
A&K / JOP	2	Bygn. 55 - Udvendige murer arbejder	x	x	x																							
A&K / PSN	3	Bygn. 55 - Udvendige blikarbejder				x	x	x	x	x	x	x																
A&K	4	Bygn.55 - performance tests						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
A&K	5	Bygn.55 - Fugearbejder	x	x	x	x	x	x	x																			
Uniplan	6	Bygn. 55 - sidste gulvbelægning i grovkøkken								x	x	x
